

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA RESP. TÉCNICO: FILLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089 ART DE EXECUÇÃO PE20241160753 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24	INÍCIO DOS SERVIÇOS: PRazo DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRazo TRANSCORRIDO: PRazo RESTANTE:	23/05/2024 06 MESES 23/11/2024 35 DIAS 149 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 1º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	1º R\$ 82.527,50 R\$ 82.527,50 11,96% 23/05/2024 A 27/06/2024 27/06/2024
---	--	---	--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	PLACA DE OBRA				2.779,67		2.779,67		2.779,67		-
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	278,67	8,00	2.229,36	8,00	2.229,36	8,00	2.229,36	-	-
1.2	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,05	8,00	40,40	8,00	40,40	8,00	40,40	-	-
1.3	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,06	32,00	353,92	32,00	353,92	32,00	353,92	-	-
1.4	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	21,42	0,88	18,84	0,88	18,84	0,88	18,84	-	-
1.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	392,09	0,08	31,36	0,08	31,36	0,08	31,36	-	-
1.6	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,22	1,60	40,35	1,60	40,35	1,60	40,35	-	-
1.7	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,45	3,20	65,44	3,20	65,44	3,20	65,44	-	-
2.0	CANTEIRO DE OBRAS				5.832,54		-		-		5.832,54
2.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	972,09	6,00	5.832,54		-	-	-	6,00	5.832,54
3.0	DEMOLIÇÕES				934,04		457,16		457,16		476,88
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,09	290,40	897,33	147,95	457,16	147,95	457,16	142,45	440,17
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,42	4,36	36,71		-	-	-	4,36	36,71
4.0	MOVIMENTO DE TERRAS				2.947,30		-		-		2.947,30
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	80,90	28,28	2.287,85		-	-	-	28,28	2.287,85
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	38,86	16,97	659,45		-	-	-	16,97	659,45
5.0	INFRA-ESTRUTURA				17.938,56		-		-		17.938,56
5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	392,09	2,06	807,70		-	-	-	2,06	807,70
5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	493,10	5,26	2.593,70		-	-	-	5,26	2.593,70
5.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,47	522,83	7.565,35		-	-	-	522,83	7.565,35
5.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	15,03	81,77	1.229,00		-	-	-	81,77	1.229,00
5.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	69,83	82,24	5.742,81		-	-	-	82,24	5.742,81
6.0	SUPER-ESTRUTURA				44.497,88		-		-		44.497,88
6.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	493,10	4,36	2.149,91		-	-	-	4,36	2.149,91
6.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,47	540,25	7.817,41		-	-	-	540,25	7.817,41
6.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	15,03	101,18	1.520,73		-	-	-	101,18	1.520,73

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA RESP. TÉCNICO: FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089 ART DE EXECUÇÃO PE20241160753 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24	INÍCIO DOS SERVIÇOS: PRazo DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRazo TRANSCORRIDO: PRazo RESTANTE:	23/05/2024 06 MESES 23/11/2024 35 DIAS 149 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 1º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	1º R\$ 82.527,50 R\$ 82.527,50 11,96% 23/05/2024 A 27/06/2024 27/06/2024
---	--	---	--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	78,34	131,34	10.289,17		-	-	-	131,34	10.289,17
6.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020	M2	174,64	130,10	22.720,66		-	-	-	130,10	22.720,66
7.0	ELEVAÇÃO				18.429,11		-		-		18.429,11
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	47,61	370,19	17.624,74		-	-	-	370,19	17.624,74
7.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,94	23,70	804,37		-	-	-	23,70	804,37
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				188.060,04		-		-		188.060,04
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,61	1.266,54	5.838,74		-	-	-	1.266,54	5.838,74
8.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,28	1.426,84	58.899,95		-	-	-	1.426,84	58.899,95
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	83,17	1.426,84	118.670,28		-	-	-	1.426,84	118.670,28
8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	35,75	130,10	4.651,07		-	-	-	130,10	4.651,07
9.0	REVESTIMENTO DE PISOS				72.502,53		-		-		72.502,53
9.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTO (X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	44,44	69,57	3.091,69		-	-	-	69,57	3.091,69
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	77,80	110,78	8.618,68		-	-	-	110,78	8.618,68
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	795,57	1,02	811,48		-	-	-	1,02	811,48
9.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	18,17	627,61	11.403,67		-	-	-	627,61	11.403,67
9.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	77,40	627,61	48.577,01		-	-	-	627,61	48.577,01
10.0	COBERTURA				135.382,90		70.109,53		70.109,53		65.273,37
10.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, CLUSO E CIMENTADO. AF_12/2015	UND	2.301,62	15,00	34.524,30		-	-	-	15,00	34.524,30

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA RESP. TÉCNICO: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089 ART DE EXECUÇÃO PE20241160753 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24	INÍCIO DOS SERVIÇOS: PRazo DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRazo TRANSCORRIDO: PRazo RESTANTE:	23/05/2024 06 MESES 23/11/2024 35 DIAS 149 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 1º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	1º R\$ 82.527,50 R\$ 82.527,50 11,96% 23/05/2024 A 27/06/2024 27/06/2024
---	--	---	--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	53,20	666,75	35.471,10	88,76	4.722,03	88,76	4.722,03	577,99	30.749,07
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,40	52,10	5.126,64	52,10	5.126,64	52,10	5.126,64	-	-
10.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	90,38	666,75	60.260,86	666,75	60.260,86	666,75	60.260,86	-	-
11.0	ESQUADRIAS				16.301,49		-		-		16.301,49
11.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/ 2019	M2	503,33	16,60	8.355,27		-	-	-	16,60	8.355,27
11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	832,86	5,00	4.164,30		-	-	-	5,00	4.164,30
11.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	945,48	4,00	3.781,92		-	-	-	4,00	3.781,92
12.0	PINTURA				57.581,23		9.181,14		9.181,14		48.400,09
12.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	35,28	130,10	4.589,92		-	-	-	130,10	4.589,92
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,95	130,10	513,89		-	-	-	130,10	513,89
12.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,23	130,10	3.412,52		-	-	-	130,10	3.412,52
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,11	130,10	2.095,91		-	-	-	130,10	2.095,91
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,64	806,77	2.936,64		-	-	-	806,77	2.936,64
12.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,89	806,77	11.206,03		-	-	-	806,77	11.206,03
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,72	806,77	13.489,19		-	-	-	806,77	13.489,19
12.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF01/2020	M2	22,95	825,51	18.945,45	400,05	9.181,14	400,05	9.181,14	425,46	9.764,31
12.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	14,13	27,72	391,68		-	-	-	27,72	391,68
13.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ACESSÓRIOS				72.126,86		-		-		72.126,86
13.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020	M2	174,64	15,88	2.773,28		-	-	-	15,88	2.773,28
13.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	706,56	2,00	1.413,12		-	-	-	2,00	1.413,12
13.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	149,57	4,00	598,28		-	-	-	4,00	598,28
13.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	351,19	32,00	11.238,08		-	-	-	32,00	11.238,08

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA RESP. TÉCNICO: FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089 ART DE EXECUÇÃO PE20241160753 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24	INÍCIO DOS SERVIÇOS: PRazo DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRazo TRANSCORRIDO: PRazo RESTANTE:	23/05/2024 06 MESES 23/11/2024 35 DIAS 149 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 1º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	1º R\$ 82.527,50 R\$ 82.527,50 11,96% 23/05/2024 A 27/06/2024 27/06/2024
---	--	---	--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
13.5	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UND	234,23	26,00	6.089,98		-	-	-	26,00	6.089,98
13.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	144,24	2,00	288,48		-	-	-	2,00	288,48
13.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	842,01	2,00	1.684,02		-	-	-	2,00	1.684,02
13.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	491,38	5,00	2.456,90		-	-	-	5,00	2.456,90
13.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UND	170,61	2,00	341,22		-	-	-	2,00	341,22
13.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UND	202,04	2,00	404,08		-	-	-	2,00	404,08
13.11	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	704,74	2,00	1.409,48		-	-	-	2,00	1.409,48
13.12	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	120,54	26,00	3.134,04		-	-	-	26,00	3.134,04
13.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	107,47	6,00	644,82		-	-	-	6,00	644,82
13.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1.017,71	4,00	4.070,84		-	-	-	4,00	4.070,84
13.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	83,64	4,00	334,56		-	-	-	4,00	334,56
13.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201	UND	36,26	8,00	290,08		-	-	-	8,00	290,08
13.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,17	162,00	1.647,54		-	-	-	162,00	1.647,54
13.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,45	18,00	368,10		-	-	-	18,00	368,10
13.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	27,60	60,00	1.656,00		-	-	-	60,00	1.656,00
13.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	14,07	120,00	1.688,40		-	-	-	120,00	1.688,40
13.21	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/202	UND	10.420,84	1,00	10.420,84		-	-	-	1,00	10.420,84
13.22	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/202	UND	9.587,36	2,00	19.174,72		-	-	-	2,00	19.174,72
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				49.361,07		-		-		49.361,07
14.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	125,49	32,00	4.015,68		-	-	-	32,00	4.015,68

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA RESP. TÉCNICO: FYLPIE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089 ART DE EXECUÇÃO PE20241160753 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24	INÍCIO DOS SERVIÇOS: 23/05/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 23/11/2024 PRAZO TRANSCORRIDO: 35 DIAS PRAZO RESTANTE: 149 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 82.527,50 VALOR ACUMULADO: R\$ 82.527,50 % ACUMULADO: 11,96% PERÍODO: 23/05/2024 A 27/06/2024 DATA DA ELABORAÇÃO: 27/06/2024
--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
14.2	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/202	UND	345,22	25,00	8.630,50		-	-	-	25,00	8.630,50
14.3	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E UINSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	223,34	25,00	5.583,50		-	-	-	25,00	5.583,50
14.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	651,74	1,00	651,74		-	-	-	1,00	651,74
14.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/201	UND	153,34	57,00	8.740,38		-	-	-	57,00	8.740,38
14.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	192,02	82,00	15.745,64		-	-	-	82,00	15.745,64
14.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	14,60	6,00	87,60		-	-	-	6,00	87,60
14.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	15,77	10,00	157,70		-	-	-	10,00	157,70
14.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	27,59	2,00	55,18		-	-	-	2,00	55,18
14.10	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO E M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,99	25,00	249,75		-	-	-	25,00	249,75
14.11	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,66	170,00	1.302,20		-	-	-	170,00	1.302,20
14.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,12	510,00	4.141,20		-	-	-	510,00	4.141,20
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.325,02		-		-		5.325,02
15.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEdia, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	124,86	36,50	4.557,39		-	-	-	36,50	4.557,39
15.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UND	767,63	1,00	767,63		-	-	-	1,00	767,63
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	690.000,24	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	82.527,50	TOTAL ACUMULADO	82.527,50	TOTAL SALDO	607.472,74

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO
DATA: 27/06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO						
1.0	PLACA DE OBRA						
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal			4,00		2,00	8,00
	Total item 1.1						8,00
1.2	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal			4,00		2,00	8,00
	Total item 1.2						8,00
1.3	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal		4,00	4,00		2,00	32,00
	Total item 1.3						32,00
1.4	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal			0,88			0,88
	Total item 1.4						0,88
1.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal			0,08			0,08
	Total item 1.5						0,08
1.6	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal			1,60			1,60
	Total item 1.6						1,60
1.7	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal			3,20			3,20
	Total item 1.7						3,20
3.0	DEMOLIÇÕES						
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2					
	Trecho 2 bloco		9,00			2,00	18,00
	Trecho 1 bloco (lado esquerdo)		9,00			2,60	23,40
	Trecho 1 bloco (lado esquerdo)		4,10			2,85	11,69
	Trecho 1 bloco (lado direito)		52,70			1,80	94,86
	Total item 3.1						147,95
10.0	COBERTURA						
10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2					
	Área complemento da estrutura metálica (1 bloco)			7,50	7,80		58,50
	Área complemento da estrutura metálica (2 bloco)			3,75	3,90		14,63
	Reforço da calha			52,10	0,30		15,63
	Total item 10.2						88,76
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M					
	Calha do 2 bloco			52,10			52,10
	Total item 10.3						52,10

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO
DATA: 27/06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
10.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2					
	Área da cobertura			53,10	12,56		666,75
	Total item 10.4						666,75
12.0	PINTURA						
12.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF01/2020	M2					
	Área da cobertura		60,00%	666,75			400,05
	Total item 12.8						400,05

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 01

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO

DATA: 27/06/2024



FOTO 1: PLACA DA OBRA;



FOTO 2: PINTURA COM ZARCÃO DA ESTRUTURA;



FOTO 3: PINTURA COM ZARCÃO DA ESTRUTURA;



FOTO 4: PINTURA COM ZARCÃO DA ESTRUTURA;



FOTO 5: PINTURA COM ZARCÃO DA ESTRUTURA;

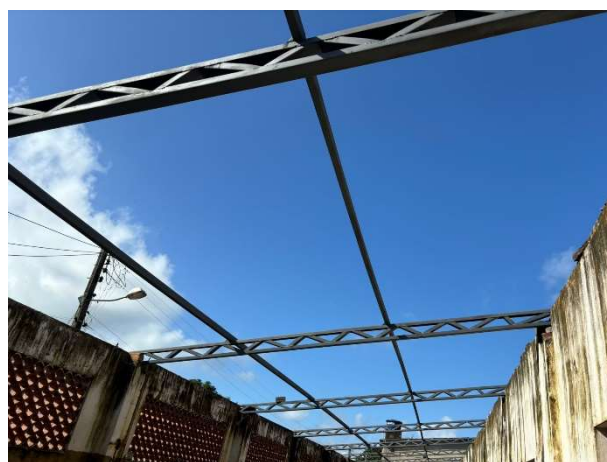


FOTO 6: PINTURA COM ZARCÃO DA ESTRUTURA;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 01

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO

DATA: 27/06/2024



FOTO 7: ESTRUTURA METÁLICA PINTADA;



FOTO 8: TELHAMENTO EXECUTADO;



FOTO 09: TELHAMENTO EXECUTADO;



FOTO 10: DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA;



FOTO 11: DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA;

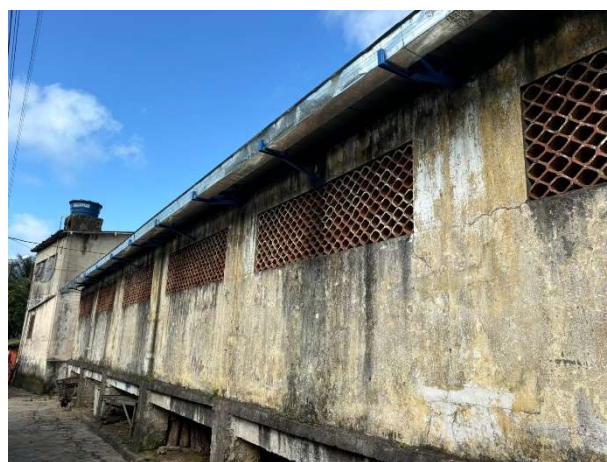


FOTO 12: CALHA EXECUTADA;
