

**PREF. M. DE S. LOURENÇO DA MATA****Secretaria da Fazenda****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

00000882

Competência:

DEZ/2024

Data e Hora Emissão:

30/12/2024 08:44:34

Código de Verificação:

9ZUP-313EM**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

PRIMAVERA - PE

Local da Prestação:

PRIMAVERA - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

20.520.477/0001-05

Inscrição Municipal:

10956

Nome/Razão Social:

HPS CONSTRUTORA EIRELI

Endereço:

PRIMEIRO DE MAIO, CENTRO. 177

Município:

SÃO LOURENÇO DA MATA

UF:

PE

CEP:

54735670

E-mail:

TEL:

(81)99528-1636**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

11.294.378/0001-61

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Endereço:

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTE, 42 CENTRO

Município:

PRIMAVERA

UF:

PE

CEP:

55510000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSE JOAQUIM DE SANTANA, NO MUNICÍPIO. CONFORME 01 BM EM ANEXO. QTD: 1 - V. UND.: R\$45.767,37 - TOTAL: R\$45.767,37

A SER REALIZADO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N 062/2024.

MAO DE OBRA R\$ 18.306,95

MATERIAL R\$ 27.460,42

BRADESCO

AG 1903 C/C 019520-0

ATESTO

Que conferi o (s)

material (eis) / serviço (s)

em 30/12/24

Roney Cesar Adao da Silva

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.767,37**

Atividade Prestada:

Código CNAE:

7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
42.151,75	0,00	45.767,37	2,00%	915,35
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	2.013,76	0,00	0,00	686,51
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº003/2006.
 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
 - O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
 - Optante pelo Simples Nacional.
- <https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

28660269901926

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 33585-1 PM PRIMAVERA-ESCOL

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A.
Agência (sem DV) 1903 S LOURENCO DA MATA
Conta corrente (com DV) 195200
CNPJ 20.520.477/0001-05
Nome favorecido HPS CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.001
Valor 42.838,26
Destinação 0
Data transferência 30/12/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9D967DC5DFDEBE10

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	30/12/2024 13:22:56
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	30/12/2024 13:26:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCNICO: GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA - RNP 1801383030 ART DE EXECUÇÃO PE20241260212 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241248260		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024-CPL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2024 CONTRATO Nº: 062/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 58.333,98	INÍCIO DOS SERVIÇOS: 27/11/2024 PRazo DE EXECUÇÃO: 02 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 27/01/2025 PRazo TRANSCORRIDO: 30 DIAS PRazo RESTANTE: 31 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 45.767,37 VALOR ACUMULADO: R\$ 45.767,37 % ACUMULADO: 78,46% PERÍODO: 27/11/2024 A 27/12/2024 DATA DA ELABORAÇÃO: 27/12/2024
---	--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.634,62						1.634,62
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	363,25	4,50	1.634,62					4,50	1.634,62
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				4.307,03		4.307,03		4.307,03		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	99,48	6,48	644,63	6,48	644,63	6,48	644,63		
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	91,56	40,00	3.662,40	40,00	3.662,40	40,00	3.662,40		
3.0	INFRAESTRUTURA				6.146,85		6.146,85		6.146,85		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	846,20	0,44	372,32	0,44	372,32	0,44	372,32		
3.2	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM	M2	100,73	14,00	1.410,22	14,00	1.410,22	14,00	1.410,22		
3.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M3	2.797,64	1,56	4.364,31	1,56	4.364,31	1,56	4.364,31		
4.0	REVESTIMENTOS				1.072,80		1.072,80		1.072,80		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	5,54	20,00	110,80	20,00	110,80	20,00	110,80		
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	48,10	20,00	962,00	20,00	962,00	20,00	962,00		
5.0	PISOS				6.530,80		6.530,80		6.530,80		
5.1	ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REV.04	M3	163,27	40,00	6.530,80	40,00	6.530,80	40,00	6.530,80		
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				361,32						361,32
6.1	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	90,33	4,00	361,32					4,00	361,32
7.0	PINTURA				602,65		104,60		104,60		498,05
7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,23	20,00	104,60	20,00	104,60	20,00	104,60		
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,40	20,00	308,00					20,00	308,00
7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	13,30	7,00	93,10					7,00	93,10
7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	13,85	7,00	96,95					7,00	96,95
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				37.677,91		27.605,29		27.605,29		10.072,62
8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	186,53	180,00	33.575,40	126,00	23.502,78	126,00	23.502,78	54,00	10.072,62

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI RESP. TÉCNICO: GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA - RNP 1801383030 ART DE EXECUÇÃO PE20241260212 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241248260	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024-CPL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2024 CONTRATO Nº: 062/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 58.333,98	INÍCIO DOS SERVIÇOS: 27/11/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: 27/01/2025 PRAZO TRANSCORRIDO: 30 DIAS PRAZO RESTANTE: 31 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º VALOR DO 1º BOLETIM: R\$ 45.767,37 VALOR ACUMULADO: R\$ 45.767,37 % ACUMULADO: 78,46% PERÍODO: 27/11/2024 A 27/12/2024 DATA DA ELABORAÇÃO: 27/12/2024
---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	4.102,51	1,00	4.102,51	1,00	4.102,51	1,00	4.102,51		
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	58.333,98	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	45.767,37	TOTAL ACUMULADO	45.767,37	TOTAL SALDO	12.566,61

Roney Cesar

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

Felipe Juvenal
Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA ELABORAÇÃO: 27/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE						
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3					
	Sapatas						
	Sapata 01			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 02			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 03			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 04			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 05			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 06			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 07			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 08			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 09			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 10			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 11			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 12			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 13			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 14			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 15			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 16			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 17			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 18			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 19			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 20			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 21			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 22			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 23			0,60	0,60	0,75	0,27
	Sapata 24			0,60	0,60	0,75	0,27
	Total item 2.1						6,48
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	M3					
	Campo de areia			10,00	20,00	0,20	40,00
	Total item 2.2						40,00
3.0	INFRAESTRUTURA						
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 01/2024	M3					
	Sapatas						
	Sapata 01			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 02			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 03			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 04			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 05			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 06			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 07			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 08			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 09			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 10			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 11			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 12			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 13			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 14			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 15			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 16			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 17			0,60	0,60	0,04	0,01

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA ELABORAÇÃO: 27/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Sapata 18			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 19			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 20			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 21			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 22			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 23			0,60	0,60	0,04	0,01
	Sapata 24			0,60	0,60	0,04	0,01
	Mureta frontal			10,00	0,20	0,04	0,08
	Mureta fundos			10,00	0,20	0,04	0,08
	Mureta lateral direita			20,00	0,20	0,04	0,16
	Mureta lateral esquerda			20,00	0,20	0,04	0,16
	Deduções		-24,00	0,60	0,60	0,03	-0,28
	Total item 3.1						0,44
3.2	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M2					
	Fechamento						
	Fachada			10,00		0,20	2,00
	Fundos			10,00		0,20	2,00
	Lateral direita			20,00		0,25	5,00
	Lateral esquerda			20,00		0,25	5,00
	Total Item 3.2						14,00
3.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	KG					
	Sapatas						
	Sapata 01			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 02			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 03			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 04			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 05			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 06			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 07			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 08			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 09			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 10			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 11			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 12			0,60	0,60	0,20	0,07
	Sapata 13			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 14			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 15			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 16			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 17			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 18			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 19			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 20			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 21			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 22			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 23			0,60	0,60	0,18	0,06
	Sapata 24			0,60	0,60	0,18	0,06
	Total item 3.3						1,56
4.0	REVESTIMENTOS						
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2					
	Fechamento						

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA ELABORAÇÃO: 27/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Fachada		2,00	10,00		0,17	3,40
	Fundos		2,00	10,00		0,17	3,40
	Lateral direita		2,00	20,00		0,17	6,80
	Lateral esquerda		2,00	20,00		0,16	6,40
	Total item 4.1						20,00
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2					
	Fechamento						
	Fachada		2,00	10,00		0,17	3,40
	Fundos		2,00	10,00		0,17	3,40
	Lateral direita		2,00	20,00		0,17	6,80
	Lateral esquerda		2,00	20,00		0,16	6,40
	Total item 4.2						20,00
5.0	PISOS						
5.1	ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REV.04	M3					
	Campo			10,00	20,00	0,20	40,00
	Total item 5.1						40,00
7.0	PINTURA						
7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2					
	=Área de reboco		20,00				20,00
	Total item 7.1						20,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2					
	Lateral direita		20,00		3,00		60,00
	Lateral esquerda		20,00		3,00		60,00
	Fachada		10,00		3,00		30,00
	Fundo		10,00		3,00		30,00
	=Soma multiplicado por 0,70 que representa o valor da composição sem a tela (não esta com a tela instalada)						126,00
	Total item 8.1						126,00
8.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN					
	Traves do campo		1,00				1,00
	Total item 8.2						1,00

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE

LOCAL: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 27/12/2024

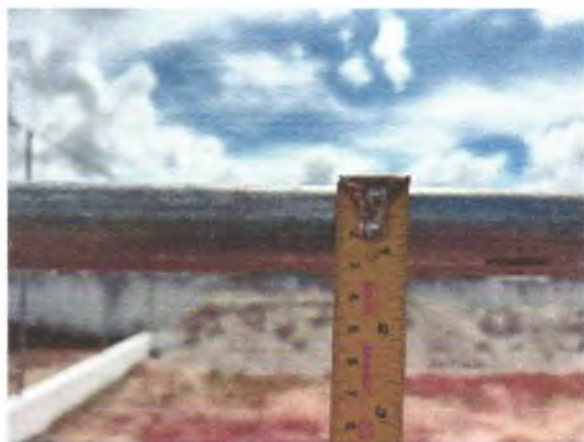


FOTO 1: TUBO DO ALAMBRADO EXECUTADO;



FOTO 2: TUBO DO ALAMBRADO EXECUTADO;



FOTO 3: CONJUNTO DE TRAVE;



FOTO 4: ESTRUTURA DO ALAMBRADO E MURETA EM ALVENARIA EXECUTADOS;



FOTO 5: AREIA DE ATERRO PARA SER EXECUTADO;



FOTO 6: AREIA DE ATERRO PARA SER EXECUTADO;

Roney Cesar Adão da Silva

Portaria 013/2024

Secretário de Infraestrutura

Felipe Juvenal
Engenheiro Civil
CREA: 162086445-6 PE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE AREIA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE

LOCAL: RUA LUIZ FERNANDES DA SILVA, S/N, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 27/12/2024



FOTO 7: AREIA DE ATERRO PARA SER EXECUTADO;



FOTO 8: AREIA DE ATERRO PARA SER EXECUTADO;



FOTO 09: AREIA DE ATERRO PARA SER EXECUTADO;



FOTO 10: ESTRUTURA DO ALAMBRADO E MURETA EM ALVENARIA EXECUTADOS;



FOTO 11: ESTRUTURA DO ALAMBRADO E MURETA EM ALVENARIA EXECUTADOS;



FOTO 12: ESTRUTURA DO ALAMBRADO A SER CHUMBADA NA BASE;
