

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61		Nota de Subempenho 1415/0002
---	--	---

Dados do Fornecedor			
Código 13710	Nome do Fornecedor B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Endereço AV GETULIO VARGAS		Cidade SALOÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 14.780.722/0001-10	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SERGIO RODRIGUES SANTANA, PROCESSO N035/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N004/2025. PERIODO DE 12/11/2025 A 19/12/2025, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. NOTA Nº1243	Valor Bruto R\$: 65.181,11

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 714
02 02 05 04 4.4.90.51.99 12.361.0021.1033.0000	PODER EXECUTIVO FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 30%	

Dados do Empenho			
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 19/12/2025	Vencimento 19/12/2025	Saldo Anterior: 293.401,03
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 999035/25	Processo 035	Valor do Subempenho: 65.181,11
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 145.641,34
			Saldo Atual: 147.759,69

Descontos:	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC 782,17 ISS 3.259,06	Valor Liquido R\$: 61.139,88
------------	---	---

VALOR A SER PAGO R\$ 61.139,88 sessenta e um mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos ***** *****

Deduzido da dotação própria 19/12/2025 Pablo Roberto de Menezes Olegário Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em : 19/12/2025  Responsável pela Liquidação	Pague-se:  Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Responsável Tesoureiro

Cheque Nº: <u>Trinta e Sete mil e noventa e oito</u> Conta: <u>31.615-6</u> Data: <u>22/12/2025</u>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 61.139,88 sessenta e um mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em <u>22/12/2025</u> Assinatura: <u>Comprometido em Anexo</u>
---	--

PRECATÓRIO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº: 1243, emitido em 19/12/2025.	Número da Nota 1243
	Data e Hora de Emissão 19/12/2025 15:38
	Código de Verificação MZIK-GTOD
	Competência 12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CNPJ/CPF: 14.780.722/0001-10 Nome: GRUPO INOCÊNCIO Razão Social: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO Município: SALOÁ	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 272279 PIS/PASEP: Não Informado UF: PE

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA CPF/CNPJ: 11.294.378/0001-61 Endereço: RUA CORONEL BRAS CAVALCANTE, 42 - CENTRO Município: PRIMAVERA E-mail: Não Informado	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 55510-000 UF: PE

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	65.181,11	3.259,06	0,00

CONTRATAÇÃO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA-PE. PROCESSO Nº 035/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025. PERÍODO DE 12/11/25 A 19/12/25, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 02.

BASE DE CÁLCULO:
MÃO DE OBRA 40% - R\$26.072,44
MATERIAL 60% - R\$39.108,67

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.181,11

Deduções (R\$) 0,00	Acrescimos (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 65.181,11	Valor do ISS (R\$) 0,00
-------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 3.259,06 → 3024
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1243, emitido em 19/12/2025
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 782,17 → 3030
- Total de retenções da nota **R\$ 4.041,23**





Emissão de comprovantes

G3312910225425621
29/12/2025 10:35:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.15
1358701358 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM PRIMAVERA-PAR -
AGENCIA: 1358-7 CONTA: 31.615-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM PRIMAVERA-PAR -
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3490-8 - SETE COLINAS PE
CONTA: 1.019-5

FAVORECIDO: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.780.722/0001-10
VALOR: R\$ 61.139,88
DEBITO EM: 22/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 4.609.1E4.A62.338.CF9

Transação efetuada com sucesso por: JI602673 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Saloá/PE, 19 de dezembro de 2025

Fatura nº 02 – Primavera
Boletim de Medição nº 02/2025 – Primavera
Nota Fiscal nº1243

Deve:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

A importância de **R\$ 65.181,11** (sessenta e cinco mil e cento e oitenta e um reais e onze centavos).

R E C I B O

Valor da Fatura	R\$ 65.181,11
Valor a Receber	R\$ 65.181,11

Recebemos do Município de Primavera/PE, a importância de **R\$ 65.181,11** (sessenta e cinco mil e cento e oitenta e um reais e onze centavos), referente ao pagamento da Fatura nº 02/2025.

Ressaltamos que este recibo somente terá valor no momento que este montante for depositado e compensado na seguinte conta bancária:

Dados Bancários:

Banco: Caixa Econômica

Agência: 3490

Operação: 003

Conta: 1019-5

Plx: contato@blconstrutora.eng.br


B L Construtora e Serviços Ltda – ME
Breno Hugo Batista Inocêncio
Representante Legal

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE EMPRESA CONTRATADA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO PE20251426330 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251362351	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 035/2025	ORDEN DE SERVIÇOS:	13/10/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	2º
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025	PRazo DE EXECUÇÃO:	4 MESES	VALOR DO 2º BOLETIM:	R\$ 65.181,11
	CONTRATO Nº: 54/2025	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO:	R\$ 110.876,26
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 293.401,03	FIM DO PRAZO:	13/02/2026	% ACUMULADO:	37,79%
		PRazo TRANSCORRIDO:	67 DIAS	PERÍODO:	12/11/2025 a 19/12/2025
		PRazo RESTANTE:	56 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	19/12/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				26.635,98		11.280,00		17.358,13		16.748,37
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	520,64	4,50	2.342,88		-	4,50	2.342,88	-	-
1.2	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	14,10	800,00	11.280,00	800,00	11.280,00	800,00	11.280,00		
1.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	8,64	112,68	973,55		-		-	112,68	973,56
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	71,14	1,09	77,54		-		-	1,09	77,54
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	28,56	26,48	756,26		-		-	26,48	756,27
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										7.470,50
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3.735,25	3,00	11.205,75		-	1,00	3.735,25	2,00	7.470,50
2	TRABALHO EM TERRA				898,29		-		898,29		-
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	106,81	7,30	779,71		-	7,30	779,71		-
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	30,80	3,85	118,58		-	3,85	118,58		-
3	INFRAESTRUTURA				9.077,50		-		9.077,50		-
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_01/2024	m²	23,49	0,36	8,45		-	0,36	8,45		-
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATÁ, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	160,41	6,40	1.026,62		-	6,40	1.026,62		-
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,20	83,63	1.354,80		-	83,63	1.354,80		-
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,50	269,09	2.825,44		-	269,09	2.825,44		-
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,26	41,82	679,99		-	41,82	679,99		-
3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	557,23	3,45	1.922,44		-	3,45	1.922,44		-
3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	365,15	3,45	1.259,76		-	3,45	1.259,76		-
4	ESTRUTURA				4.618,47		72,60		4.618,47		-
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE: DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	77,19	7,92	611,34		-	7,92	611,34		-
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,50	206,36	2.166,78		-	206,36	2.166,78		-
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,26	19,09	310,40		-	19,09	310,40		-
4.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	557,23	1,58	880,42		-	1,58	880,42		-
4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	365,15	1,58	576,93		-	1,58	576,93		-

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
EMPRESA CONTRATADA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636
ART DE EXECUÇÃO PE20251426330
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251362351

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 035/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
CONTRATO Nº: 54/2025
VALOR DO CONTRATO: R\$ 293.401,03

ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025
PRazo DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ADITIVO DE PRAZO:
FIM DO PRAZO: 13/02/2026
PRAZO TRANSCORRIDO: 67 DIAS
PRAZO RESTANTE: 56 DIAS
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2º
VALOR DO 2º BOLETIM: R\$ 65.181,11
VALOR ACUMULADO: R\$ 110.876,26
% ACUMULADO: 37,79%
PERÍODO: 12/11/2025 a 19/12/2025
DATA DA ELABORAÇÃO: 19/12/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.6	VERGA PRÉ MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	33,00	2,20	72,60	2,20	72,60	2,20	72,60	-	-
5	COBERTURA				87.822,54		34.205,62		59.300,98		28.521,54
5.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	22,75	2.086,80	47.474,70	1.129,73	25.701,35	1.635,33	37.203,75	451,47	10.270,94
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	m²	77,55	250,40	19.418,52	75,12	5.825,55	250,40	19.418,51	-	-
5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	167,42	16,00	2.678,72	16,00	2.678,72	16,00	2.678,72	-	-
5.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	33,61	60,00	2.016,60	-	-	-	-	60,00	2.016,60
5.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	615,55	16,00	9.848,80	-	-	-	-	16,00	9.848,80
5.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	53,21	120,00	6.385,20	-	-	-	-	120,00	6.385,20
6	PAREDES E REVESTIMENTOS				54.081,57		15.134,59		15.134,59		38.946,98
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	67,78	62,06	4.206,42	59,28	4.017,99	59,28	4.017,99	2,78	188,43
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,15	124,12	639,21	118,56	610,58	118,56	610,58	5,56	28,63
6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	73,59	594,68	43.762,50	118,56	8.724,83	118,56	8.724,83	476,12	35.037,67
6.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	65,97	54,00	3.562,38	27,00	1.781,19	27,00	1.781,19	27,00	1.781,19
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	72,17	26,48	1.911,06	-	-	-	-	26,48	1.911,06
7	ESQUADRIAS				12.702,86		4.488,30		4.488,30		8.214,56
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.026,82	8,00	8.214,56	-	-	-	-	8,00	8.214,56
7.2	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	49,87	90,00	4.488,30	90,00	4.488,30	90,00	4.488,30	-	-
8	PINTURA				99.502,43		-		-		93.502,46
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	4,58	486,68	2.228,99	-	-	-	-	486,68	2.228,99
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	18,88	245,20	4.629,37	-	-	-	-	245,20	4.629,38
8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,59	889,24	14.752,49	-	-	-	-	889,24	14.752,49

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
EMPRESA CONTRATADA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636
ART DE EXECUÇÃO PE20251426330
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251362351

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 035/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
CONTRATO Nº: 54/2025
VALOR DO CONTRATO: R\$ 293.401,03

ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ADITIVO DE PRAZO:
FIM DO PRAZO: 13/02/2026
PRAZO TRANSCORRIDO: 67 DIAS
PRAZO RESTANTE: 56 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2º
VALOR DO 2º BOLETIM: R\$ 65.181,11
VALOR ACUMULADO: R\$ 110.876,26
% ACUMULADO: 37,79%
PERÍODO: 12/11/2025 a 19/12/2025
DATA DA ELABORAÇÃO: 19/12/2025

	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	30,56	21,80	666,20		-		-	21,80	666,21
8.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	85,80	800,00	68.640,00		-		-	800,00	68.640,00
8.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	13,50	191,51	2.585,38		-		-	191,51	2.585,39
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.061,39		-		-		4.061,40
9.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,73	61,80	1.404,71		-		-	61,80	1.404,71
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,86	185,40	1.457,24		-		-	185,40	1.457,24
9.3	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	149,93	8,00	1.199,44		-		-	8,00	1.199,44
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	293.401,03	TOTAL 2ª MEDIÇÃO	65.181,11	TOTAL ACUMULADO	110.876,26	TOTAL SALDO	189.995,31

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182966445-6 PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 31.780.527/0001-10

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE

LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE

DATA BASE: 19/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE - REV 01 Remoção da pintura do piso	M2		40,00	20,00		800,00
	Total item 1.2						800,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Administração local da obra - engenheiro 1 dia por semana e	MÊS		1,00			1,00
	Total item 1.2.1						1,00
4.0	ESTRUTURA						
4.6	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas WC's	M	2,00	1,10			2,20
	Total item 4.6						2,20
5.0	COBERTURA						
5.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	M2					
	Banzo inferior	Qtd Tesouras	Comp.			Kg/m	
	Perfil U Simples (US) - bw x bf = 100 x 40 mm - esp.= 2.66mm	2,00	32,00			3,51	224,64
	Banzo superior						
	Perfil U Simples (US) - bw x bf = 100 x 40 mm - esp.= 2.66mm	2,00	32,00			3,51	224,64
	Fechamento parte posterior						
	Perfil U Simples (US) - bw x bf = 100 x 40 mm - esp.= 2.66mm		40,00			3,51	140,40
	Diagonais das treliças						
	Cantoneira 7/8 x 1/8 mm - esp.=3.18mm	4,00	57,60			1,04	239,62
	Terças da cobertura						
	Perfil U Enrijecido (UE) - bw x bf x D = 75 x 40 x 15 mm - esp.=2.66mm	20,00	8,00			3,42	547,20
	Fechamento parte posterior						
	Perfil U Enrijecido (UE) - bw x bf x D = 75 x 40 x 15 mm - esp.=2.66mm		60,00			3,42	205,20
	Chapas de apoio dos pilares	Qtd Tesouras vezes 2 "extremidades"	Comp.		Larg.	Kg/m²	
	Chapa grossa aço 3/8" (e=9.5mm)	4,00	0,60		0,30	74,48	53,63
	= Medido no 8M anterior	-1,00	505,60				-505,60

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE

LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE

DATA BASE: 19/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE						
	Total item 5.1						1.129,73
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2					
	Coberta da ampliação			31,30	8,00	0,30	75,12
	Total item 5.2						75,12
5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M					
	Coberta da ampliação		2,00		8,00		16,00
	Total item 5.3						16,00
6.0	PAREDES E REVESTIMENTOS						
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2					
	Fechamento dos WC's		2,00	1,50		2,60	7,80
	Dedução das portas		-2,00	0,90		2,10	-3,78
	Fechamento boneca da entrada		2,00	0,30		2,10	1,26
	Calha fundos		2,00	45,00		0,60	54,00
	Total item 6.1						59,28
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2					
	2x área de alvenaria		2,00	59,28			118,56
	Total item 6.2						118,56
6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2					
	= Área de chapisco		118,56				118,56
	Total item 6.3						118,56
6.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2					
	Calha fundos			45,00		0,60	27,00
	Total item 6.4						27,00
7.0	ESQUADRIAS						
7.2	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UN					
	Calha dos fundos			90,00			90,00
	Total item 7.2						90,00

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA,
LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCAL: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
DATA: 19/12/2025



FOTO 1: BONECA DE ACESSO EXECUTADA;



FOTO 2: DIVISÓRIA EM ALVENARIA EXECUTADA;



FOTO 3: ESTRUTURA METÁLICA EXECUTADA;

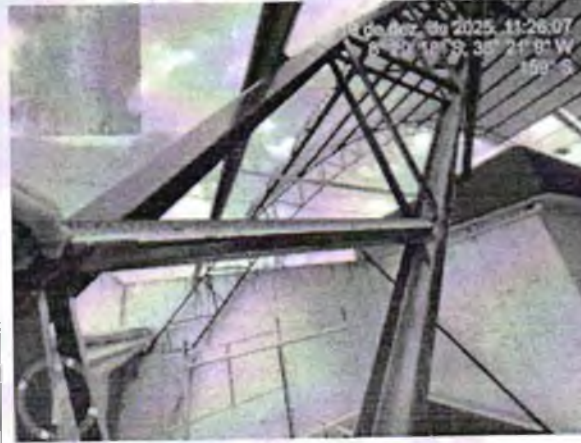


FOTO 4: ESTRUTURA METÁLICA EXECUTADA;



FOTO 5: ESTRUTURA METÁLICA EXECUTADA;



FOTO 6: CALHA EXECUTADA;

Handwritten signature
R. L. S. Engenharia e Projetos Ltda - ME
CNPJ 11.790.722/0001-10

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA,
LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE
LOCAL: RUA SÃO MATEUS, 723, CENTRO, PRIMAVERA/PE
DATA: 19/12/2025



FOTO 7: CALHA DE ALVENARIA EXECUTADA;



FOTO 8: CALHA DE ALVENARIA EXECUTADA;



FOTO 09: CALHA DE ALVENARIA EXECUTADA;



FOTO 10: CALHA DE ALVENARIA EXECUTADA;



FOTO 11: CALHA DE ALVENARIA EXECUTADA;



FOTO 12: CALHA DE ALVENARIA EXECUTADA;

Assinatura
 B. S. Construtora e Serviços Ltda - ME
 CNPJ: 16.052.722/0001-08
